N°	Responsable	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**PROJET DE CONSTRUCTION DE L'UIT**	**2341.82 j?**	**05.04.17**	**02.02.27**
2	MO	Procédure de concours	214 j	05.04.17	29.01.18
3	MO / MG	Lettre d'accord MG pour phase 4.31	0 j	20.04.18	20.04.18
4	Autorités	Accord 2ème prêt Pays Hôte	0 j	04.01.21	04.01.21
5	Autorités	Fonds 2ème tranche disponibles (date à confirmer)	0 j	15.02.21	15.02.21
6		**Conseil UIT**	**774 j**	**11.06.19**	**14.10.22**
7	MO	Conseil 2019	10 j	11.06.19	24.06.19
8	MO	Session extraordinaire 2019	1 j	27.09.19	27.09.19
9	MO	Conseil 2020	9 j	09.06.20	19.06.20
10	MO	Conseil 2021	9 j	08.06.21	18.06.21
11	MO	Conseil 2022	9 j	22.03.22	01.04.22
12	MO	PP 2022	15 j	24.09.22	14.10.22
13		**Planification MG et approbations MO**	**914 j**	**20.04.18**	**14.03.22**
14		**Phase 4.31 - Avant-projet**	**297 j**	**20.04.18**	**08.07.19**
15	MG	Développement avant-projet	297 j	20.04.18	08.07.19
16	MO	Approbation finale MO	0 j	08.07.19	08.07.19
17		**Phase 4.32 - Partie 1: Modification du projet**	**78 j**	**02.09.19**	**20.12.19**
18	MG	Modification du projet	77 j	02.09.19	19.12.19
19	MO	Approbation finale MO	0 j	20.12.19	20.12.19
20	**MG**	**Phase 4.32 - Partie 2 / Phase 4.33: Projet et Autorisation de construire**	**250 j**	**06.01.20**	**01.02.21**
21	MG	Phase 4.32 - Partie 2: Projet de l'ouvrage	249 j	06.01.20	29.01.21
22	MG	Phase 4.33 - Préparation dossiers autorisation	89 j	06.07.20	27.11.20
23	MO	Phase 4.33 - Vérification dossier autorisation en vue de sa finalisation	10 j	16.10.20	29.10.20
24	MG	Phase 4.33 - Dépôt DD	0 j	18.12.20	18.12.20
25	MO	Phase 4.32 - Partie 2 - Vérification MO dossier projet en vue de sa finalisation	15 j	30.11.20	18.12.20
26	MO	Phases 4.32 / 4.33 - Approbation finale MO	0 j	01.02.21	01.02.21
27	**MO**	**Phase 4.41 - Dossier d'appel d'offres**	**513 j**	**06.01.20**	**14.03.22**
28	MO	Cahier I - Conditions générales / procédures MO	250 j	06.01.20	01.02.21
29	MG	Cahier II - Conditions particulières	149 j	01.02.21	20.09.21
30	MO	Cahier II - Approbation MO	0 j	20.09.21	20.09.21
31	MG	Cahier III - Soumissions et descriptifs par CFC	238 j	02.02.21	07.02.22
32	MO	Cahier III - Approbation MO pour compilation AO	0 j	07.02.22	07.02.22
33	MG	Correction et finalisation du dossier AO	25 j	08.02.22	14.03.22
34		**Demandes d'autorisation**	**132 j**	**18.12.20**	**13.07.21**
35	SIG	Elaboration et dépôt dossier autorisation poste transfo SIG	6 mois	04.01.21	13.07.21
36	SIG	Obtention autorisation poste transfo SIG estimée	0 j	13.07.21	13.07.21
37	MO / MG	Dépôt DD Bâtiment	0 j	18.12.20	18.12.20
38	Autorités	Procédure administrative autorisation de construire bâtiment	120 j	04.01.21	25.06.21
39	Autorités	Obtention autorisation bâtiment estimée	0 j	25.06.21	25.06.21
40		**Procédure d'appel d'offre**	**355 j**	**10.06.21**	**13.12.22**
41	MO	Publication EOI par l'UIT	0 j	10.06.21	10.06.21
42	MO	Short-list EG retenues pour AO restreint	15 j	12.10.21	01.11.21
43	MO	Publication RFP appel d'offre aux EG pré-qualifiées	0 j	14.03.22	14.03.22
44	EG	Réception des offres EG	0 j	03.06.22	03.06.22
45	MG	Evaluations et clarifications techniques des offres	50 j	07.06.22	29.08.22
46	MG	Rapport d'évaluation techniques	0 j	29.08.22	29.08.22
47	MO	Evaluations et clarifications financières	5 j	30.08.22	05.09.22
48	MO	Rapport d'évaluation et recommandation	25 j	30.08.22	05.10.22
49	MO	Soumission à la CDM	0 j	05.10.22	05.10.22
50	MO	Recommandation de la CDM	15 j	05.10.22	26.10.22
51	MO	Décision d'adjudication par le Secrétaire Général	0 j	26.10.22	26.10.22
52	MO / MG	Négociation et validation contrat EG	25 j	25.10.22	29.11.22
53	MO	Signature contrat EG	0 j	29.11.22	29.11.22
54	MO	Décision ouverture de chantier	0 j	13.12.22	13.12.22
55		**Phase Exécution**	**1188.18 j?**	**27.01.22**	**02.02.27**
56	EG / MG / MO	Phase 4.51 - Projet d'exécution	400 j	13.12.22	06.09.24
57		**Travaux relocalisation UIT**	**220 j**	**27.01.22**	**23.12.22**
58	MO	Préparation locaux Tour et MB et relocalisation	176 j	27.01.22	25.10.22
59	MO	Libération des locaux Varembé par l'UIT	44 j	25.10.22	23.12.22
60		**Phase 4.52 - Travaux préparatoires**	**198 j?**	**07.02.23**	**05.12.23**
61	EG / MG / MO	Travaux et mise en service poste transfo SIG	128 j?	07.02.23	25.08.23
62	MO	Travaux assainissement	3 mois	11.04.23	17.07.23
63	EG / MG / MO	Travaux de démolition	45 j	14.07.23	03.10.23
64	EG / MG / MO	Terrassements, fondations, canalos sous radier et radier	45 j	03.10.23	05.12.23
65	**EG / MG / MO**	**Phase 4.52 - Construction EG**	**620 j**	**05.12.23**	**13.07.26**
66	EG / MG / MO	Gros-œuvre	250 j	05.12.23	06.01.25
67	EG / MG / MO	Installations cvser + appareillage	510 j	09.01.24	24.02.26
68	EG / MG / MO	Façades + Toiture	180 j	13.11.24	21.08.25
69	EG / MG / MO	Aménagements intérieurs	190 j	26.06.25	16.04.26
70	EG / MG / MO	Aménagements extérieurs	90 j	03.03.26	13.07.26
71	EG / MG / MO	Mise en service et test intégral	65 j	21.04.26	23.07.26
72	EG / MG / MO	Remise de l'ouvrage	0 j	27.07.26	27.07.26
73	EG	Direction des travaux de garantie	120 j	24.07.26	02.02.27
74	EG	Documentation de l'ouvrage	45 j	04.09.26	09.11.26
75	MG	Vérification documentation de l'ouvrage	30 j	12.10.26	23.11.26
76	MO	Approbation documentation de l'ouvrage	20 j	23.11.26	21.12.26
77	EG	Décompte final	60 j	02.11.26	02.02.27

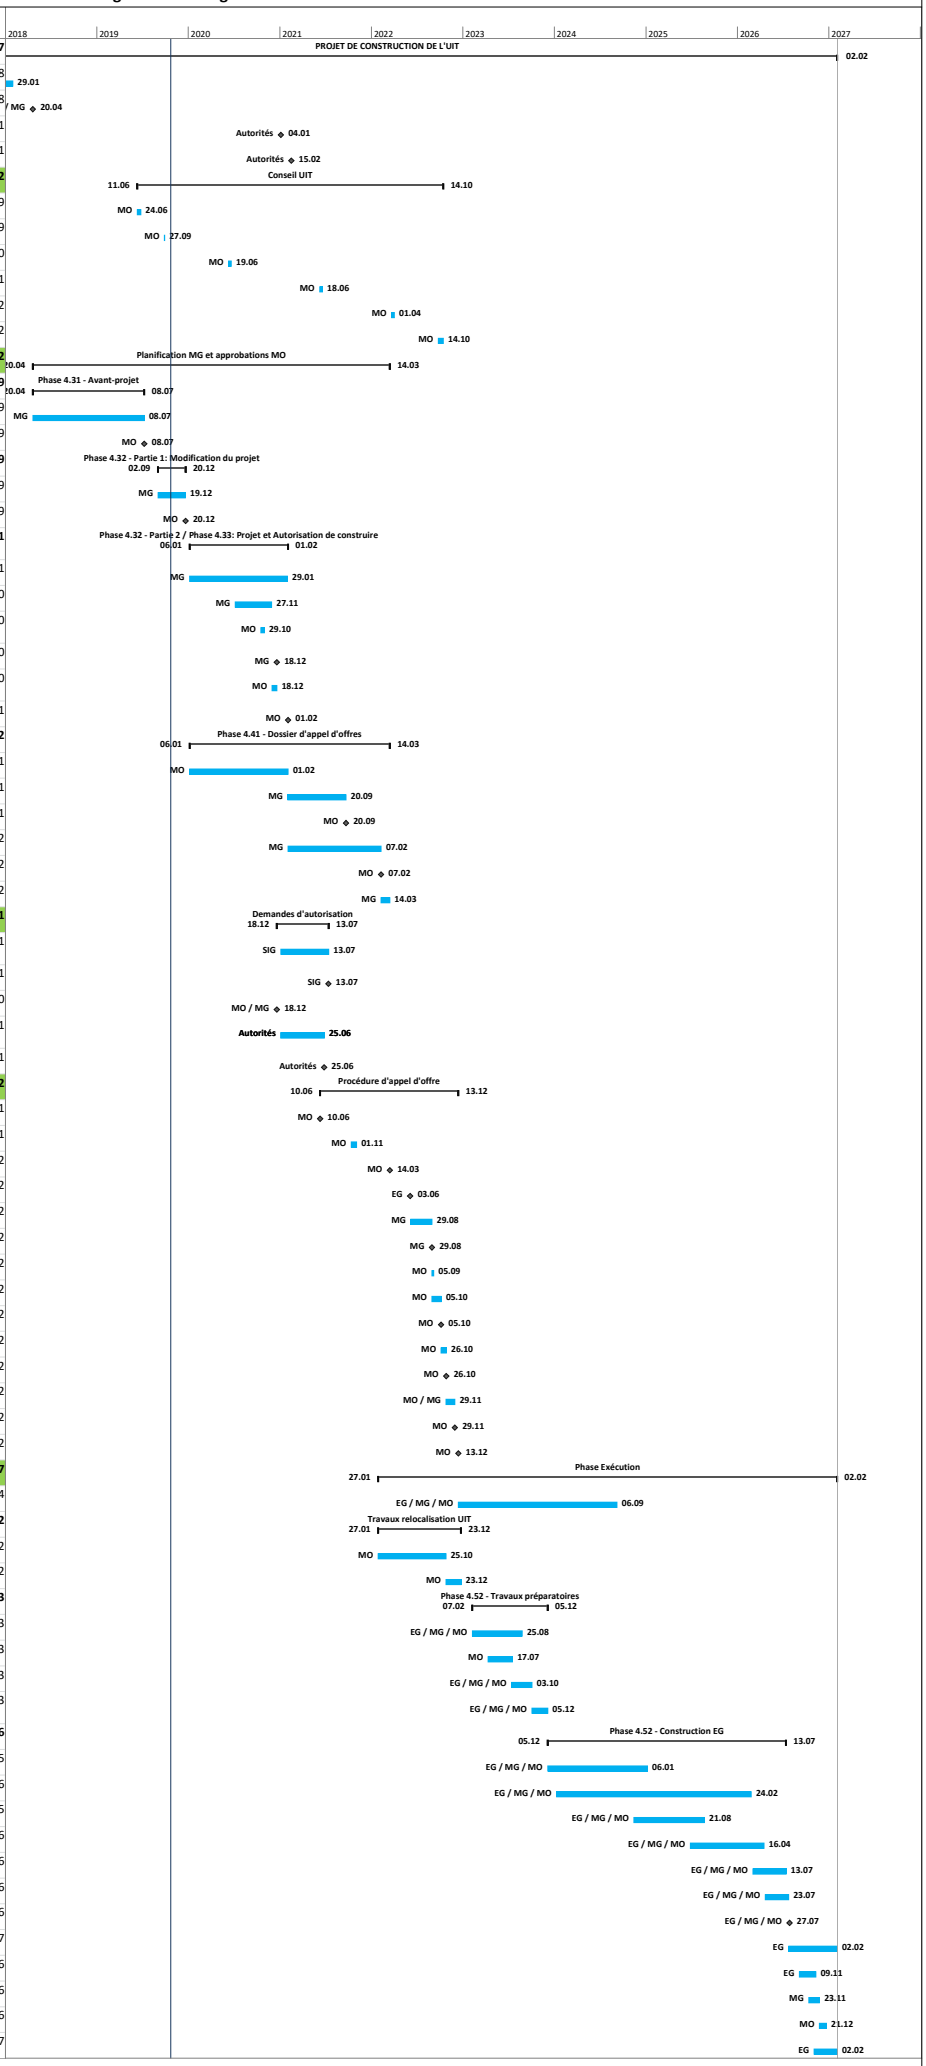

Tâche autorités · Tâche Maître ouvrage · Tâche Entreprise · Récapitulative · Avancement · Tâche en cours · Tâche non commencée en retard
Tâche · Tâche Mandataire · Jalon · Récapitulatif du projet · Tâche achevée · Tâche en cours en retard · Progression manuelle
